

RONDA DE DALT

TRAM 1. FASE 2

Abril 2024






ACTUACIONS A LA RONDA DE DALT DE BARCELONA



COBERTURA I URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA RONDA DE DALT. TRAM 1

ACTUACIÓ: Cobertura i urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

TRAM 1: AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

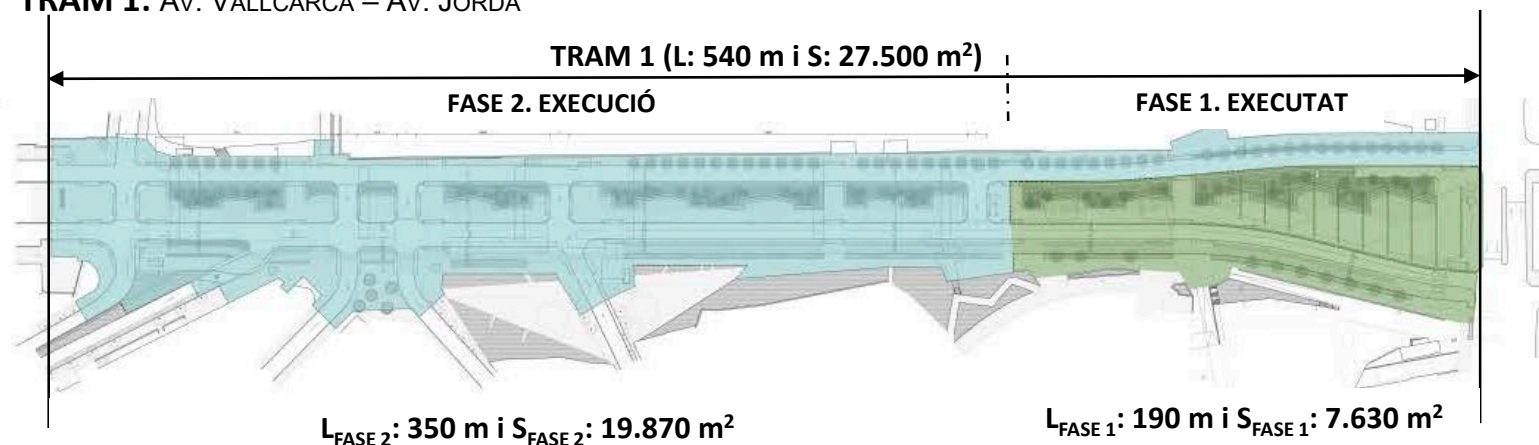

FASE 2

PROJECTES DE COBERTURA (ESTRUCTURA I INST.) REDACTATS

- PR. ESTRUCTURA. APROVAT DEF. (INV. 18,6 M€)
- PR. INSTAL·LACIONS. ACTUALITZACIÓ EN REDACCIÓ (INV. 12,6 M€)

PROJECTE D'URBANITZACIÓ EN REDACCIÓ (INV. 9,8 M€)

LONGITUD ≈ 340 M

INVERSIÓ NECESSÀRIA: 41 M€

FASE 1

OBRA DE COBERTURA FINALITZADA (INV. 12,04M€)

OBRA D'URBANITZACIÓ FINALITZADA (INV. 5,28M€)

LONGITUD ≈ 200 M

INVERSIÓ REALITZADA: 17,32 M€

PROJECTE DE COBERTURA (ESTRUCTURA) RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A


ACTUACIÓ: Estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt. Inclou sortides d'emergència del nou túnel

TRAM 1. FASE 2: AV. VALLCARCA – IES VALL HEBRON

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE APROVAT DEF.: 13/02/2024. **OBRA FASE 2A ADJUDICADA: 11/03/2024**

INICI OBRA FASE 2A: JUNY 24 (21 MESOS) / FINALITZACIÓ COBERTURA: MAIG 27

COST DE L'ACTUACIÓ (PCA 2023): 17.750.904,50 €. FASE 2A: 11,33 M€

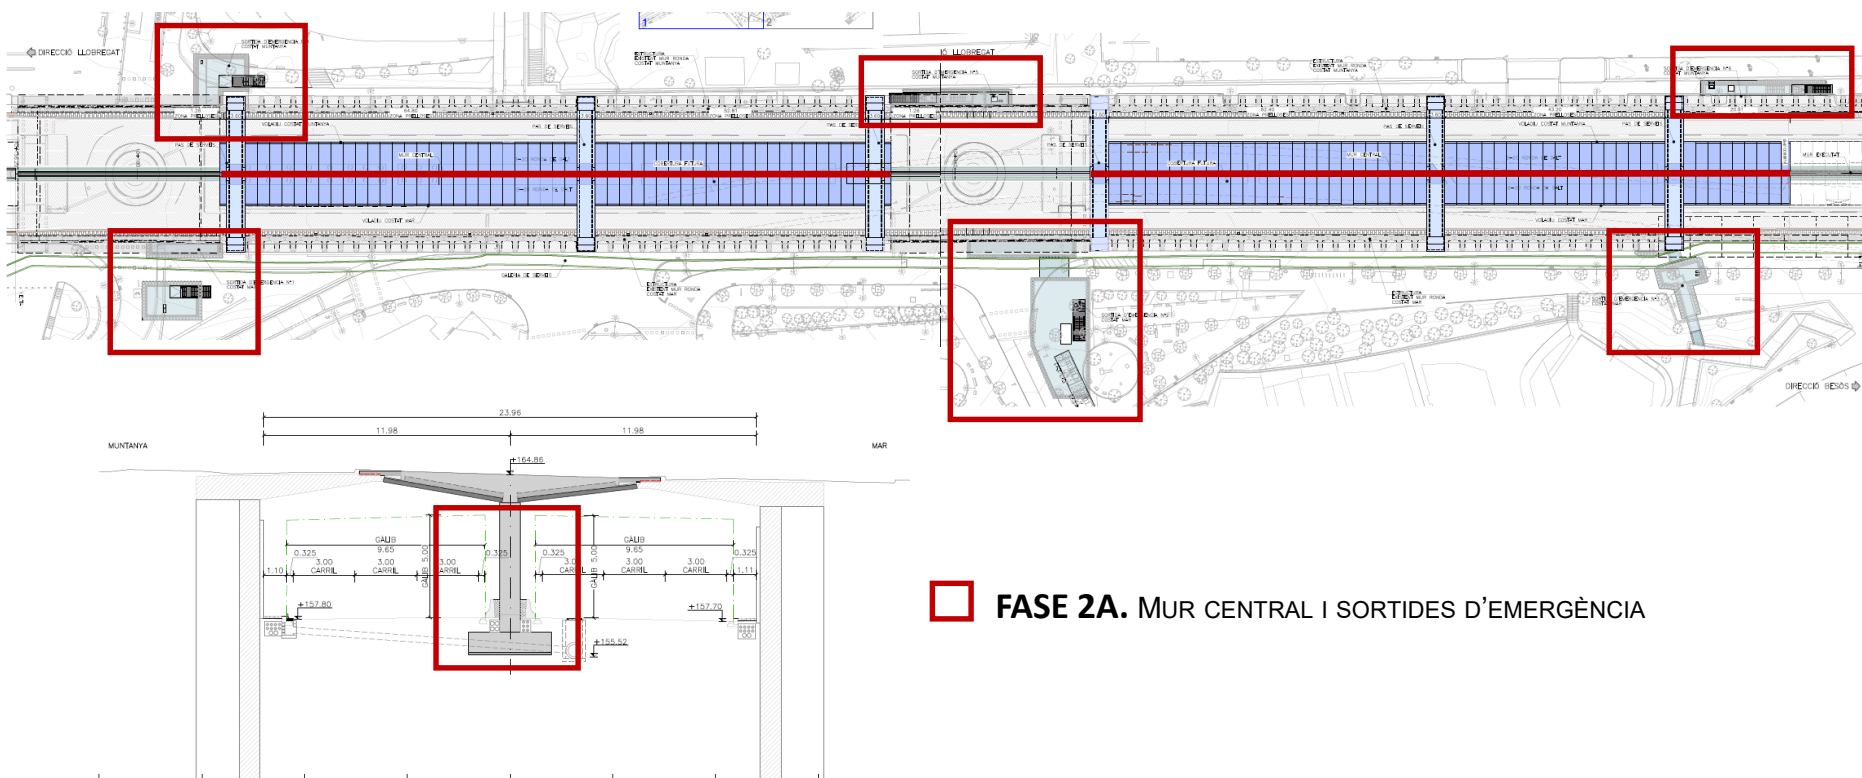

 **FASE 2A. MUR CENTRAL I SORTIDES D'EMERGÈNCIA**



PROJECTE DE COBERTURA (ESTRUCTURA) RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2B



ACTUACIÓ: Estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt. Inclou sortides d'emergència del nou túnel.

TRAM 1. FASE 2: AV. VALLCARCA – IES VALL HEBRON

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE APROVAT DEF.: 13/02/2024. LICITACIÓ OBRA FASE 2B: DESEMBRE 24

INICI OBRA FASE 2B: JUNY 25 (23,5 MESOS) / FINALITZACIÓ COBERTURA: MAIG 27

COST DE L'ACTUACIÓ (PCA 2023): 17.750.904,50 €. FASE 2B: 6,42 M€

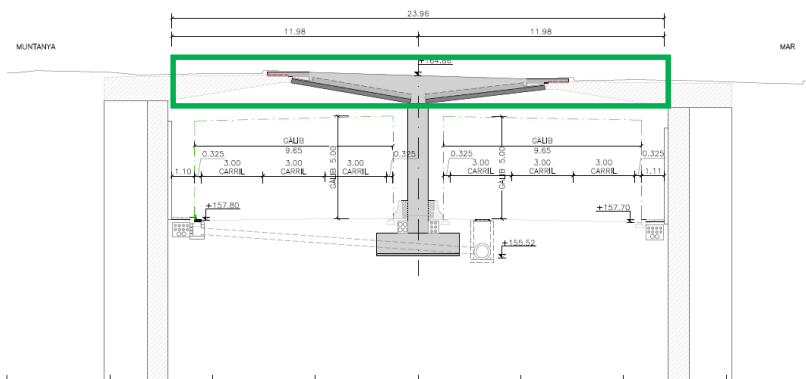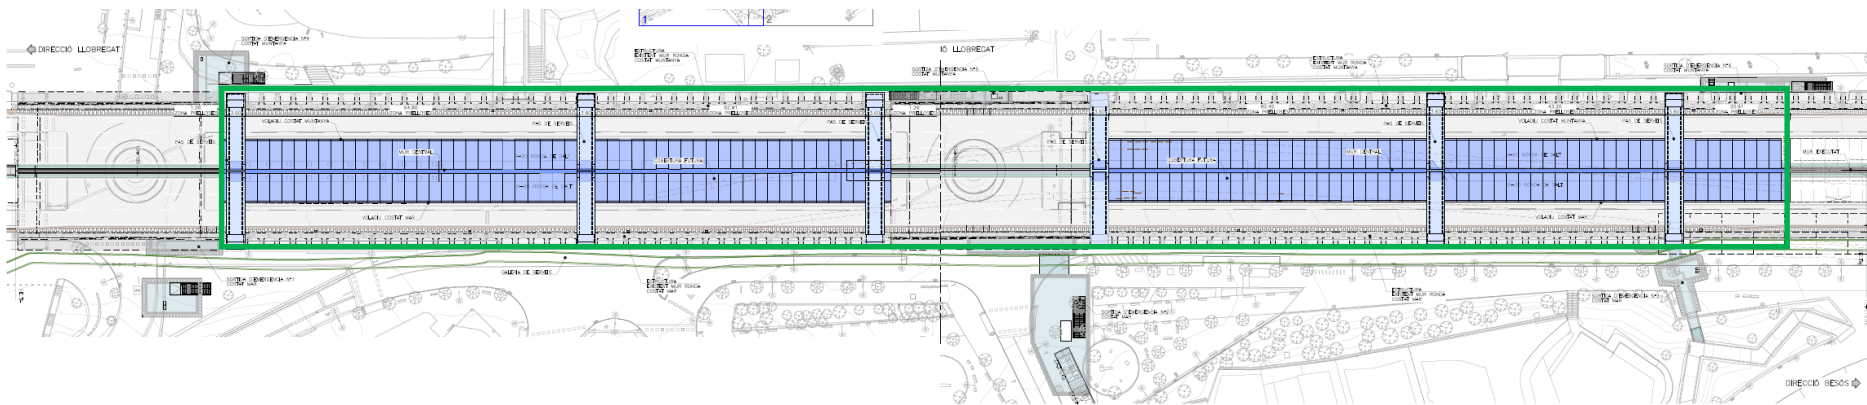

 **FASE 2B. COBERTA (EXECUCIÓ AMB INSTAL·LACIONS)**



PROJECTE DE COBERTURA (INSTAL·LACIONS) RONDA DE DALT. TRAM 1. FASES 1 I 2


ACTUACIÓ: Instal·lacions per al nou túnel generat entre l'Av. Vallcarca i l'Av. Jordà. L: 540 m

TRAM 1: AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: ACTUALITZACIÓ EN REDACCIÓ. **LICITACIÓ OBRA INSTAL·LACIONS:** DESEMBRE 24

INICI OBRA INSTAL·LACIONS: JUNY 25 (23,5 MESOS) / **FINALITZACIÓ COBERTURA:** MAIG 27

COST ESTIMAT DE L'ACTUACIÓ (PCA): 12 ME

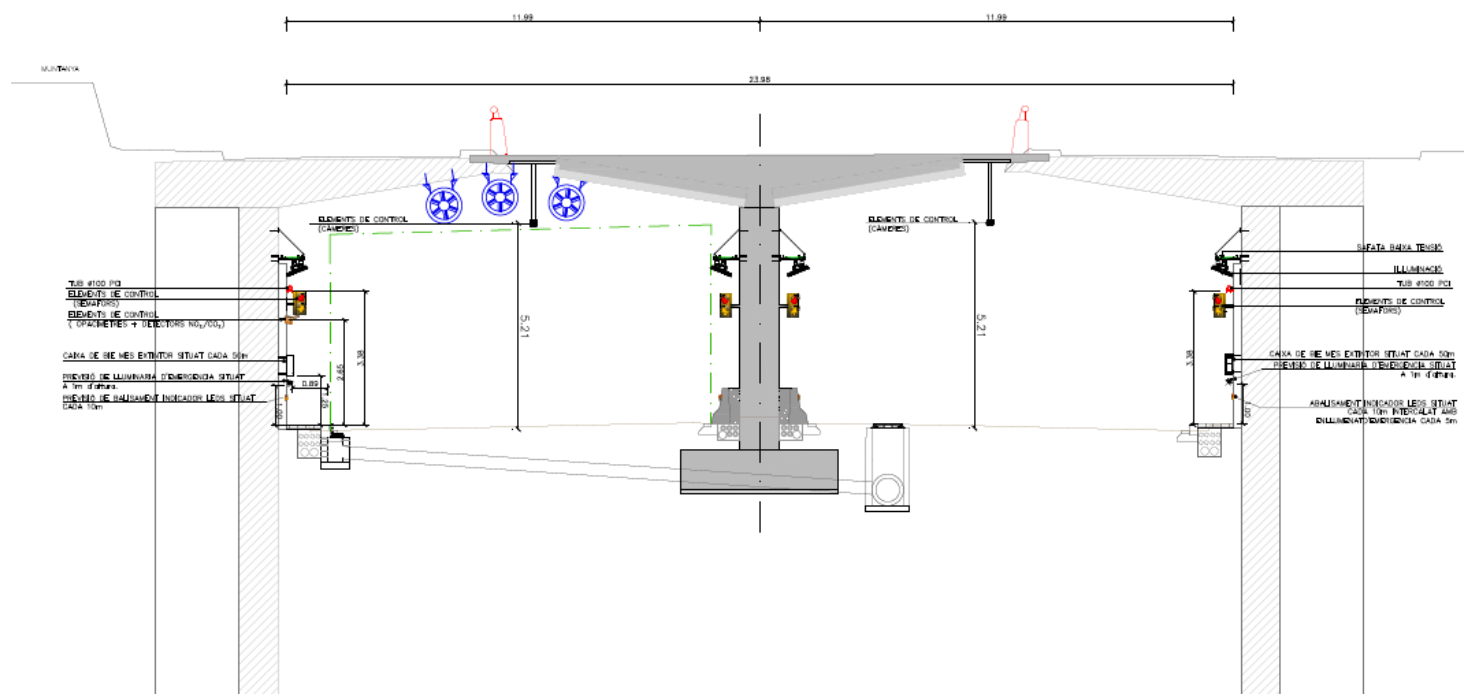



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2

ACTUACIÓ: Urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

TRAM 1. FASE 2: AV. VALLCARCA – IES VALL HEBRON

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE EN REDACCIÓ. **LICITACIÓ OBRA URBANITZACIÓ:** DESEMBRE 26.

INICI OBRA URBANITZACIÓ: JUNY 27 / **FINALITZACIÓ URBANITZACIÓ:** MAIG 28 (12 MESOS)

COST ESTIMAT DE L'ACTUACIÓ (PCA): 9,3 M€

