

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**

**DECIDIM.
BARCELONA**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Estat dels projectes**





2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre l'estat i el contingut dels projectes.


AVÍS: Enviament ENQUESTA DE VALORACIÓ DE L'EXECUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.

- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions.



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI

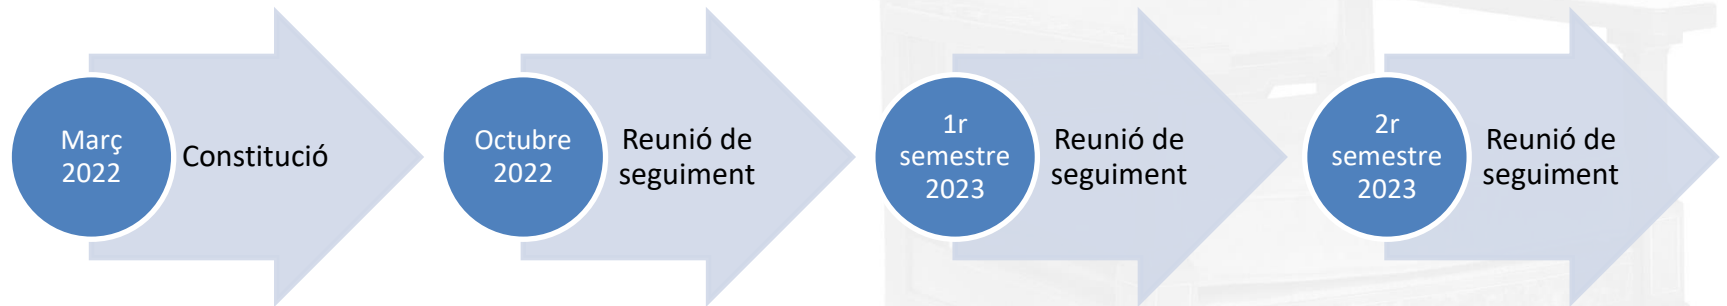



3. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Convertim el pati de l'Escola la Farigola en un pulmó verd del barri	350.000 €
Construïm una cuina a l'Escola La Pau	400.000 €
Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris	1.000.000 €
Pacifiquem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons	250.000 €
Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot	725.000 €
Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou	365.000 €
Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot	390.000 €



3. Estat dels projectes

Títol	Convertim el pati de l'Escola la Farigola en un pulmó verd del barri
Import	350.000 €
Percentatge d'execució	99 %
Previsió execució	Pròximament s'arribarà al 100%
Previsió finalització	Octubre 2022
Òrgan executor	CEB (Consorti Educació Barcelona)
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	Només falta revisar alguns detalls de funcionament.



3. Estat dels projectes

Títol	Construïm una cuina a l'Escola La Pau
Import	400.000 €
Percentatge d'execució	90%
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte 2023 – Execució de les obres
Previsió finalització	Desembre 2022
Òrgan executor	CEB (Consorti Educació Barcelona)
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	<p>El menjador ja està en funcionament.</p> <p>La cuina està previst que estigui acabada a finals d'octubre de 2022. Finalment, s'ha aconseguit afegir al projecte el canvi del mobiliari del menjador (taules i cadires) així com la millora del paviment del menjador.</p> <p>Per afegir aquest paviment, es necessiten uns dies en que el menjador no es faci servir. S'instal·larà durant les vacances de Nadal.</p> <p>El mobiliari de moment no ha arribat.</p>



3. Estat dels projectes

Títol	Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris
Import	1.000.000 €
Percentatge d'execució	30 %
Previsió execució	2022 – Projecte bàsic i Projecte executiu redactat 2023 – Tramitació de les obres Estiu 2023 – Inici de les obres
Previsió finalització	Desembre 2023 / Gener 2024 (durada de les obres: 6 mesos)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	Pròxima reunió 11 d'octubre
Estat actual	S'ha fet la reunió amb Patrimoni, en termes generals la proposta ha sigut ben acollida. S'han fet algunes aportacions que comentarem a la reunió de l'11 d'octubre.



3. Estat dels projectes

Títol	Pacificuem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons
Import	250.000 €
Percentatge d'execució	35 %
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte Finals d'octubre 2022 – Executiu definitiu Desembre 2022 - Aprovació administrativa (exposició pública) i licitació de l'obra Abril 2023 – Inici de les obres
Previsió finalització	Setembre 2023 – Finalització prevista de les obres* *Aquest projecte es redacta conjuntament amb altres entorns escolars, i caldrà definir l'ordre d'execució de cadascun, un cop es planifiqui l'obra amb l'adjudicatari. El termini estimat de 13 setmanes d'obra és pel conjunt de l'actuació.
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	El projecte executiu està en fase de tramitació tècnica, preveiem tenir executiu definitiu a finals d'octubre.



3. Estat dels projectes

Títol	Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot
Import	725.000 €
Percentatge d'execució	30 %
Previsió execució	Finals 2022 – Executiu redactat. Juliol 2023 – Inici de les obres
Previsió finalització	Desembre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	Si
Estat actual	Ja s'ha produït la descontractació formal de l'anterior arquitecta redactora, Ens falta rebre 2 ofertes de les 3 sol·licitades pel nou contracte. Es van sol·licitar les ofertes el passat dia 28 de setembre.



3. Estat dels projectes

Títol	Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou
Import	365.000 €
Percentatge d'execució	30 %
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte Juliol 2023 – Inici de les obres
Previsió finalització	Novembre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	Reunió interna BIMSA-Districte 4 d'octubre Posteriorment, reunió amb grup promotor.
Estat actual	Els redactors assajaran 3 qüestions pel tema grada: Sempre al recinte del joc de bàsquet: -Grades retràctils que es recullen en un element prisma -Element Rai proposat anteriorment (3 bancs de diferent mida que permeten diferents activitats) -Element Vora que s'assajarà a la ciutat.



3. Estat dels projectes

Títol	Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot
Import	390.000 €
Percentatge d'execució	35 %
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte Finals Abril 2023 – Inici de les obres
Previsió finalització	Setembre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Previsió participació	Pròxima reunió amb grup promotor: finals d'octubre
Estat actual	Pendants del lliurament de la maqueta, per iniciar la fase de tramitació tècnica. Si tot va bé, es preveu disposar d'executiu definitiu cap a mitjans de novembre.

Gràcies per la vostra participació
