

# Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius  
2020-2023**

**DECIDIM.  
BARCELONA**





## **ORDRE DEL DIA**

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Estat dels projectes**





## 2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment


### OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre l'estat i el contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions.



## 2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

### CALENDARI

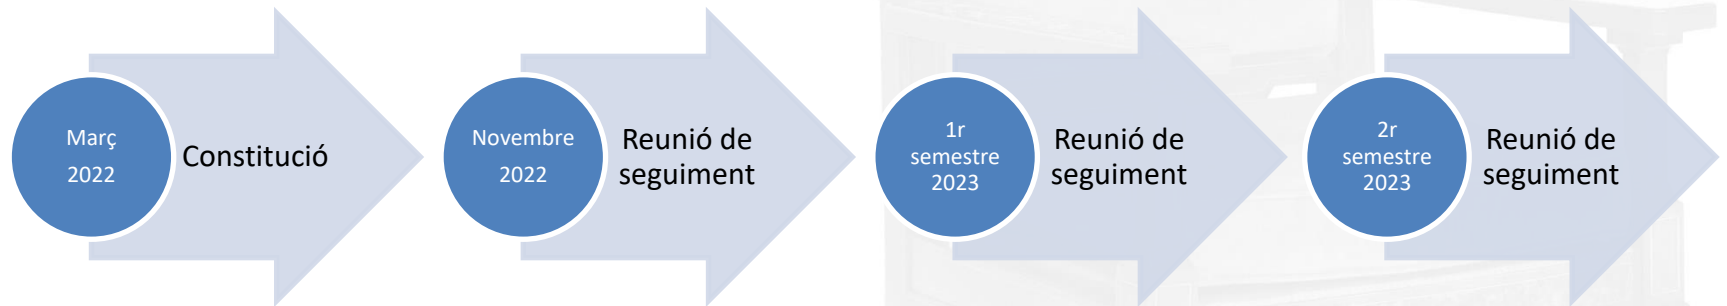



### 3. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Fem una Gràcia més verda	500.000 €
Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola	50.000 €
Acabem amb els espais foscos a Gràcia	300.000 €
Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll	200.000 €
Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri	<del>450.000 €</del> 471.000 €
Renovem l'Àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn	<del>225.000 €</del> 280.000 €
Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36	150.000 €
Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució	350.000 €



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Fem una Gràcia més verda
<b>Import</b>	500.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Execució</b>	2021 – Llistat de carrers prioritaris Desembre 2022 – Redacció del projecte executiu Abril 2023 – Aprovació inicial Agost 2023 – Adjudicació de les obres Setembre 2023 – Inici de les obres
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2023
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Fem una Gràcia més verda
<b>Import</b>	500.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Llistat de carrers sobre els que s'actuarà</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taxdirt (entre Sardanya i Pau Alsina)</li><li>• Sant Lluís (Escorial - Montmany)</li><li>• Topazi (entre Plaça del Diamant i Rubí)</li><li>• Trav. Gràcia (Gran de Gràcia - Vic)</li><li>• Gràcia (escola Patronat Domènech)</li><li>• Martí (entre Escorial i d'Alegre de Dalt)</li><li>• Bruniquer (Joanic - Torrent Flors)</li></ul>
<b>Increment d'espai verd</b>	+ 83 arbres + 187m2 de parterres



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola
<b>Import</b>	50.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Execució</b>	Juliol 2022 – Finalització del estudi històric Octubre 2022 – Disseny de la senyalització Novembre 2022 – Producció Desembre 2022 – Instal·lació de la senyalització i publicació d'un portal a la web del Districte
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2022
<b>Òrgan executor</b>	Districte



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola
<b>Import</b>	50.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Camí ral a Sant Cugat (2)</b>	





## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Acabem amb els espais foscos a Gràcia
<b>Import</b>	300.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Execució</b>	Abril 2022 – Passejades exploratòries per identificar espais foscos Juny 2022 – Priorització amb el Consell de Dones Setembre 2022 – Projecte executiu primeres actuacions Desembre 2022 – Projecte executiu de la resta d'actuacions
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2023
<b>Òrgan executor</b>	Districte i enllumenat

## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Acabem amb els espais foscos a Gràcia
<b>Import</b>	300.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Primeres actuacions</b>	Camí forestal accés Park Güell (17/10 - 04/11) Av. Coll del Portell – La Miranda (14/11 - 25/11) Accessos Parc Sanitari Pere Virgili (17/10 - 4/11) Sortida pàrquing c/ Esteve Terradas (21/11 - 2/12) Sota viaducte de Vallcarca (28/11 - 2/12)
<b>Llista d'actuacions</b>	<a href="#">Enllaç al Decidim</a>






## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll
<b>Import</b>	200.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Execució</b>	Maig 2022 – Presentació a la Taula d'Urbanisme del Coll Desembre 2022 – Finalització projecte executiu Març 2023 – Aprovació inicial Agost 2023 – Adjudicació de les obres Setembre 2023 – Inici de les obres
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2023
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA

## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll
<b>Import</b>	200.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35%
<b>Distribució dels vestuaris</b>	

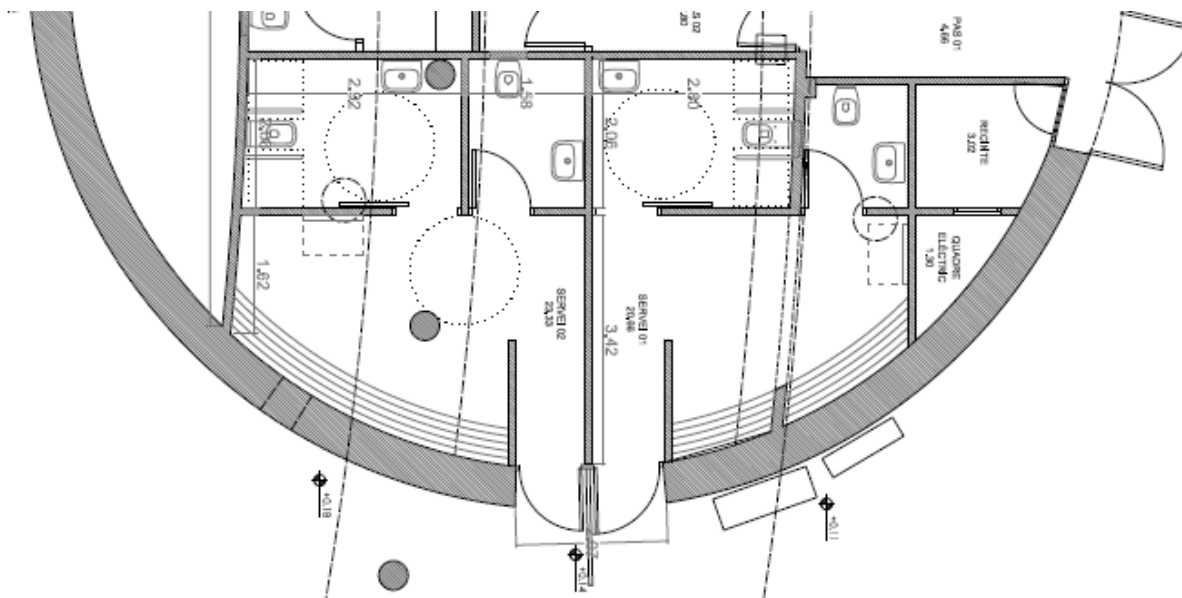




## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri
<b>Import</b>	471.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	80%
<b>Execució</b>	Juny 2022 – Inici de les obres Setembre 2022 – Finalització de les obres del pati
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2022
<b>Òrgan executor</b>	CEB
<b>Actuacions pendents</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compra de les cistelles de bàsquet (14/11)</li><li>• Revestiment de fusta vertical al nucli de les escales de P3 (pont de desembre)</li><li>• Modificació de la il·luminació del pati (pont de desembre)</li><li>• Instal·lació del sistema de megafonia</li></ul>



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri
<b>Import</b>	471.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	80%

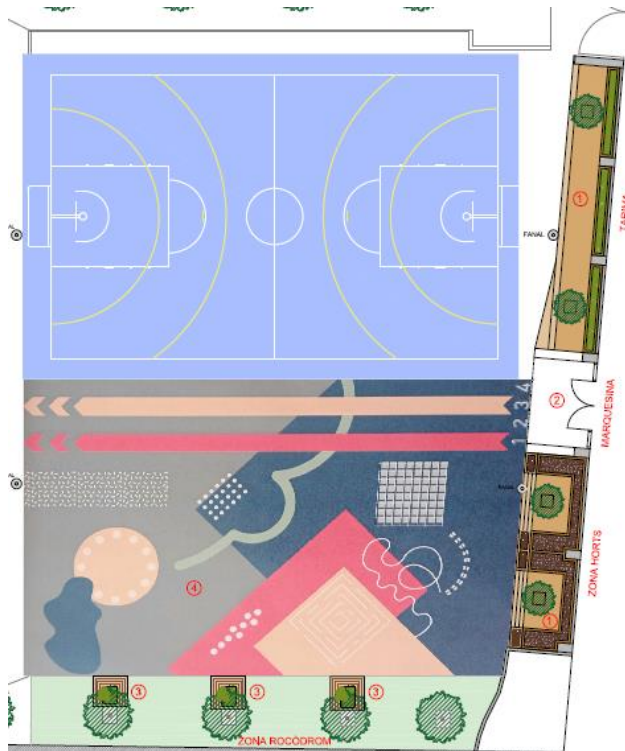



## 5. Estat dels projectes


<b>Títol</b>	Renovem l'Àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn
<b>Import</b>	280.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	50%
<b>Execució</b>	Novembre 2021 – Participació infantil Febrer 2022 – Presentació avantprojecte a les promotores Novembre 2022 – Aprovació inicial Març 2023 – Adjudicació de les obres Abril 2023 – Inici de les obres, fins juliol 2023
<b>Previsió finalització</b>	2023
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Renovem l'Àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn
<b>Import</b>	280.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	50%

### Proposta de jocs: Àrea de jocs inclusiva

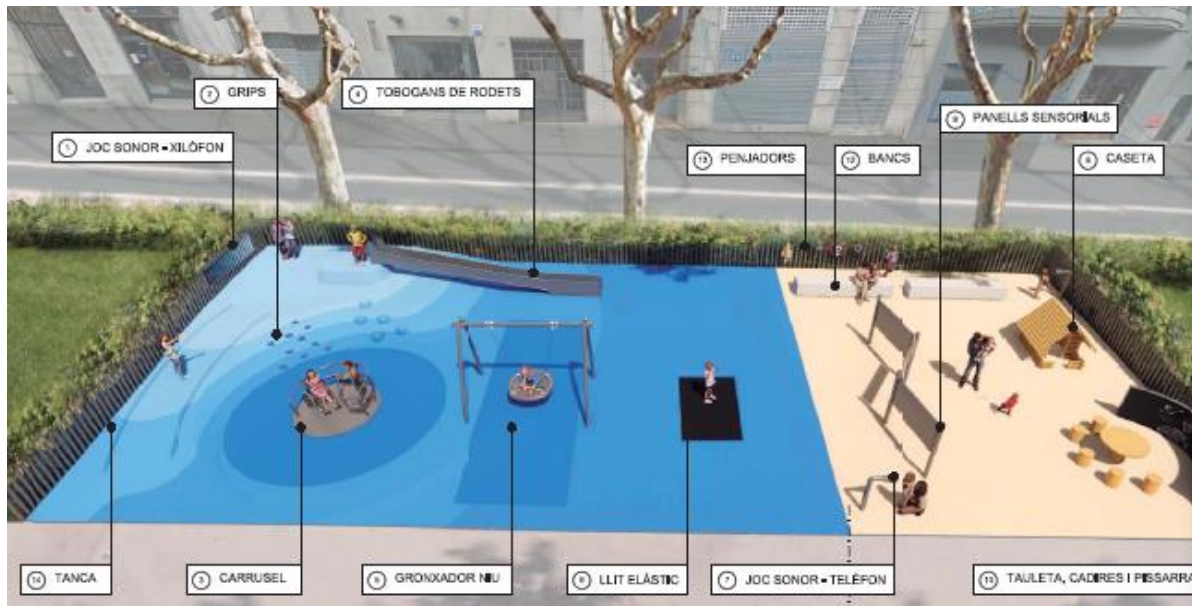

#### Elements urbans:

Bancs  
Penjadors  
Tanca

#### 2 àrees de jocs:

- Joc dinàmic (blau)  
- Jocs tranquil (groc)

## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36
<b>Import</b>	150.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	5%
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2023
<b>Òrgan executor</b>	Districte
<b>Execució</b>	PPT en redacció






## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució
<b>Import</b>	350.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35 %
<b>Execució</b>	Novembre 2021 – Participació infantil Juny 2022 – Presentació avantprojecte a les promotores, veïnat i comerciants. Desembre 2022 – Projecte executiu Juny 2023 – Adjudicació de l'obra Setembre 2023 – Inici obres
<b>Previsió finalització</b>	Novembre 2023
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA

## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució
<b>Import</b>	350.000 €
<b>Percentatge d'execució</b>	35 %
<b>Proposta d'espai de joc</b>	

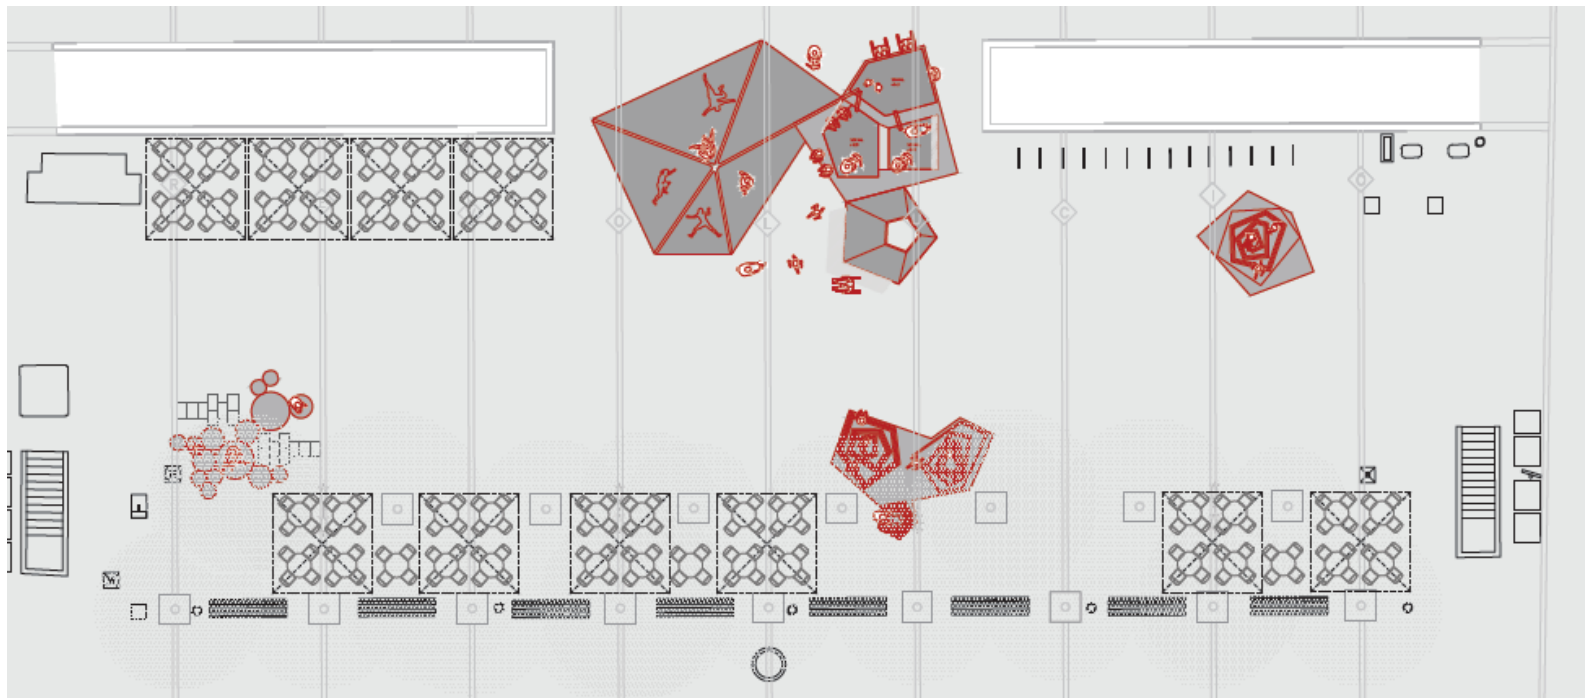

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament  
de Barcelona**

