

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**

**DECIDIM.
BARCELONA**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Estat dels projectes**





2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment


OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre l'estat i el contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions.



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI

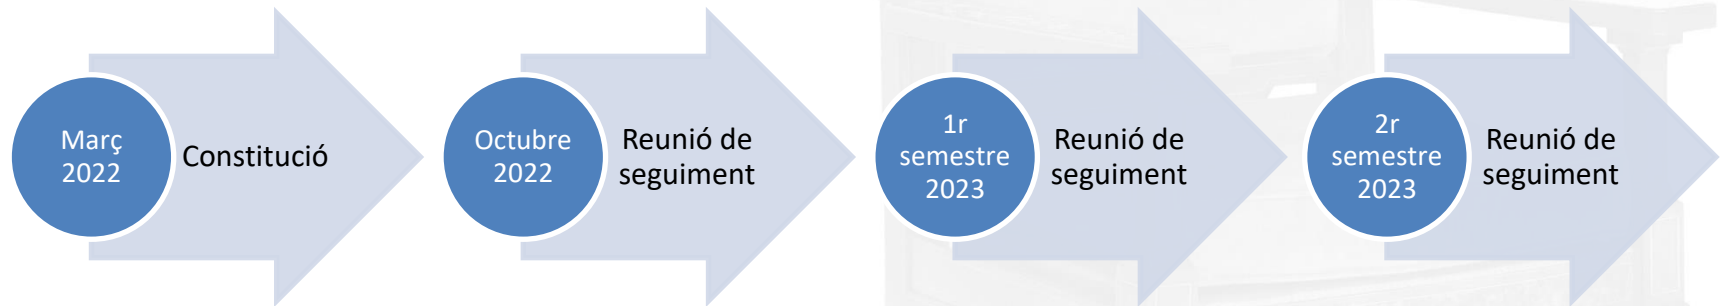



3. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Enjardinem el Raval	180.000 €
Posem en valor la muralla romana	65.000 €
Adaptem la plaça dels Àngels per als infants	150.000 €
Creem més àrees de joc infantil al Raval	600.000 €
Convertim l'associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible	50.000 €
Pacifiquem l'entorn de l'Escola Collaso i Gil	130.000 €
Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval	785.000 €
Creem un carril bici al passeig Joan de Borbó	920.000 €
Instal·lem una boia per mesurar l'acidificació del Mediterrani	200.000 €



3. Estat dels projectes

Títol	Enjardinem el Raval
Import	180.000 €
Percentatge d'execució	30%
Previsió execució	Segon trimestre del 2023
Previsió finalització	Juny 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	Ja s'ha elaborat la maqueta del projecte. Es preveu tindre la tramitació tècnica del projecte a finals d'octubre.



3. Estat dels projectes

Títol	Posem en valor la muralla romana
Import	65.000 €
Percentatge d'execució	40%
Previsió execució	Novembre 2022
Previsió finalització	Desembre 2022
Òrgan executor	ICUB
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	El passat mes d'agost es va signar el conveni de col·laboració amb els propietaris del local. Actualment l'ICUB està licitant les obres i s'espera que a finals de mes hi hagi empresa adjudicatària



3. Estat dels projectes

Títol	Adaptem la plaça dels Àngels per als infants
Import	150.000 €
Percentatge d'execució	10%
Previsió execució	-
Previsió finalització	-
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Pla de Barris
Estat actual	Finalment el projecte no podrà dur-se a terme per la incompatibilitat de les obres d'ampliació del MACBA amb la intervenció plantejada de pressupostos participatius i del Pla de Barris. Els diners es destinaran al projecte <i>Creem més àrees de joc infantil al Raval</i> .



3. Estat dels projectes

Títol	Creem més àrees de joc infantil al Raval
Import	600.000€ + 150.000€
Percentatge d'execució	25%
Previsió execució	2022 – Redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu. 2023 – Licitació i execució de les obres.
Previsió finalització	Febrer 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	Ja s'ha elaborat l'avantprojecte. Es preveu tindre la maqueta del projecte a finals d'octubre.



3. Estat dels projectes

Títol	Convertim l'associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible
Import	50.000 €
Percentatge d'execució	100%
Previsió execució	Projecte finalitzat
Previsió finalització	Projecte finalitzat
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	-
Estat actual	Les obres i les compres vinculades al projecte ja s'han realitzat. Aquesta setmana s'instal·laran els ordinadors.



3. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem l'entorn de l'Escola Collaso i Gil
Import	130.000 €
Percentatge d'execució	30%
Previsió execució	2022 – Redacció projecte 2023 – Inici d'obres el mes d'abril
Previsió finalització	3 setmanes després de l'inici de les obres.
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Mobilitat, Neteja
Estat actual	Ja s'ha entregat la maqueta del projecte. Es preveu tindre el projecte executiu a principis de novembre.



3. Estat dels projectes

Títol	Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval
Import	785.000 €
Percentatge d'execució	30%
Previsió execució	<i>Graons</i> – Inici obres 5 doctubre de 2022 <i>Sant Antoni Abad</i> – Inici obres setembre 2023
Previsió finalització	<i>Graons</i> – Novembre 2022 <i>Sant Antoni Abad</i> – Setembre 2024
Òrgan executor	BIMSA i Districte
Òrgans municipals implicats	-
Estat actual	Sant Antoni Abad – El novembre s'entregarà la maqueta del projecte, i el projecte executiu el febrer de 2023.



3. Estat dels projectes

Títol	Creem un carril bici al passeig Joan de Borbó
Import	920.000 €
Percentatge d'execució	15%
Previsió execució	A determinar
Previsió finalització	A determinar
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Mobilitat i Districte
Estat actual	Actualment el projecte està en negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona, que és de qui depèn aquella zona. Cal un acord sobre l'actuació entre ambdós administracions per a poder començar a implementar el projecte.



3. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem una boia per mesurar l'acidificació del Mediterrani
Import	200.000 €
Percentatge d'execució	20%
Previsió execució	2022 – Signatura conveni
Previsió finalització	2023
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Barcelona Cicle de l'Aigua SA
Estat actual	S'estan ultimant els detalls per a la signatura del conveni entre l'Ajuntament i l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) on es determinaran, entre d'altres, drets i obligacions pel que fa a la dotació econòmica, posada en funcionament , manteniment de la instal·lació i traspàs de les dades obtingudes.

Gràcies per la vostra participació
