

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**DECIDIM.
BARCELONA**

**Pressupostos participatius
2020-2023**

Comissió de seguiment de 25 de gener de 2024





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari**
- 2. Enquestes de valoració**
- 3. Estat dels projectes**






1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari

OBJECTIUS I FUNCIONS


- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament i calendari de les obres pendents.
- Estar informats sobre la planificació de finalització dels projectes.





1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari

CALENDARI

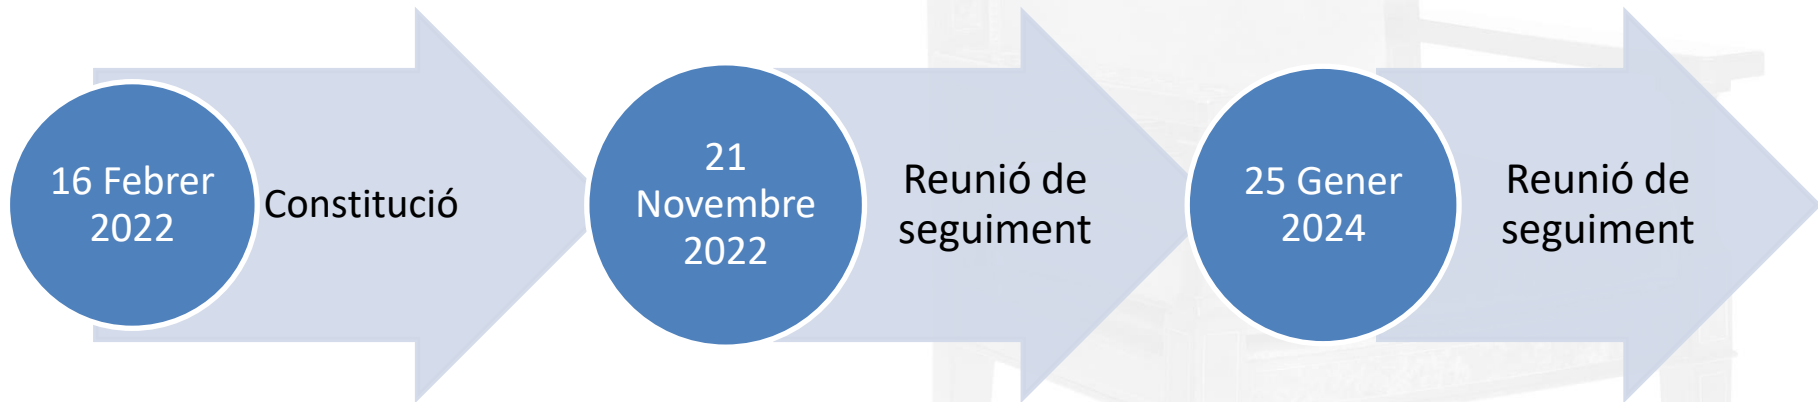



2. Enquestes de valoració

Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació amb tècnics ajuntament, problemes d'aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el que vas proposar, nivell de satisfacció...

Hi ha diverses opcions en funció del grau d'execució del projecte.

- **Opció A:** Projecte que ja s'ha executat completament: et proposem que valoris el conjunt d'aquesta fase d'execució.
- **Opció B:** Projecte que ja disposa de projecte executiu i que resta a l'espera de la licitació i/o execució de l'obra: et proposem que valoris la primera part de l'execució.
- **Opció C:** Projecte que ja s'ha executat completament i del qual ja vas valorar la primera part de l'execució: et proposem que valoris el projecte executat.

S'enviarà correu personalitzat a cada grup de promotors amb l'enllaç al formulari



Millorar la participació a Barcelona



10 minuts



No es recull cap dada personal



3. Estat dels projectes

Estat	Projectes	Import	Import final
100%	Creem un carril bici a la Via Augusta	1.100.000 €	1.098.000 €
100%	Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes	340.000 €	210.500 €
100%	Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lurdes	50.000 €	50.000 €
45%	Superilla al Farró- Pacifiquem el barri	370.000 €	435.000 €
45%	Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt	120.000 €	340.000 €
10%	Urbanitzem el carrer de Romaninar	112.500 €	0 €



3. Estat dels projectes

Títol	Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs)
Import	1.100.000 €
Execució	2022 – Redacció del projecte Aprovació tècnica i administrativa juliol 2022- set 2022 Inici d'obres 2023
Previsió finalització	Aproximadament 6 mesos
Òrgan executor	BIMSA
Finalitzat	S'ha dividit l'actuació en 2 àmbits, per ajustar-los a la disponibilitat pressupostària: <ul style="list-style-type: none">• TRAM GANDUXER- DOLORS MONSERDÀ: Inici obres 2023.• TRAM DOLORS MONSERDÀ- PLAÇA BORRÀS: Redacció del projecte: 2023



3. Estat dels projectes

Títol	Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes. Pl.Molina-Pl. Joaquim Folguera
Import	340.000 €
Execució	Redacció del projecte 15 Març de 2022 Tramitació tècnica: 15 de Març – 30 d’Abril 2022 Tramitació tècnica i administrativa: Gener 2023 Inici d’obres 2023
Òrgan executor	BIMSA
Finalitzat	El projecte està condicionat al calendari d’obres de la L9/L10 (estació Putxet), promogudes per la Generalitat de Catalunya. La voluntat de l’Ajuntament és executar el projecte dins del exercici del 2023.



3. Estat dels projectes

Títol	Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lurdes
Import	50.000 €
Execució	2021 – avantprojecte 2022 – Abril-Maig (informes i aprovació administrativa) Inici obres 7 Novembre 2022
Previsió finalització	Realització d'obres durant les vacances escolars de 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Protegim escoles
Finalitzat	L'actuació inclou l'ampliació de vorera i la col·locació d'una barana just davant de l'Escola Lourdes, també la instal·lació de mobiliari urbà i arbrat.



3. Estat dels projectes

Títol	Superilla al Farró-Pacifiquem el barri
Import	370.000 €
Previsió execució	2021 – Redacció del Pla d’acció Març 2022 – Entrega del Pla d’acció Abril 2023 - Projecte Executiu definitiu
Previsió finalització	2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Superilles i Districte
Estat actual	Projecte final acabat i aprovat al juliol 2023. Obra adjudicada a l’octubre 2023. Inici de l’execució de l’obra previst a finals febrer 2024. Final de l’obra previst al maig 2024.




3. Estat dels projectes

Títol	Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt
Import	120.000 € + € increment pressupost
Previsió execució	2021 – Estudi del terreny. 2022 – Avantprojecte tancat. Projecte final acabat i aprovat a l'octubre de 2023. Obra adjudicada a principis de gener de 2024. Previsió inici de les obres al febrer de 2024 Previsió durada de les obres: 5 mesos Previsió finalització de les obres al juliol de 2024.
Previsió finalització	Estiu 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte-Mans al verd
Estat actual	Reconeixement del terreny (contaminació) L'Avantprojecte està redactat i validat pel grup impulsor, Espais Verds i Districte. Adjudicació obra



Plànol projecte Hort Sarrià de Dalt

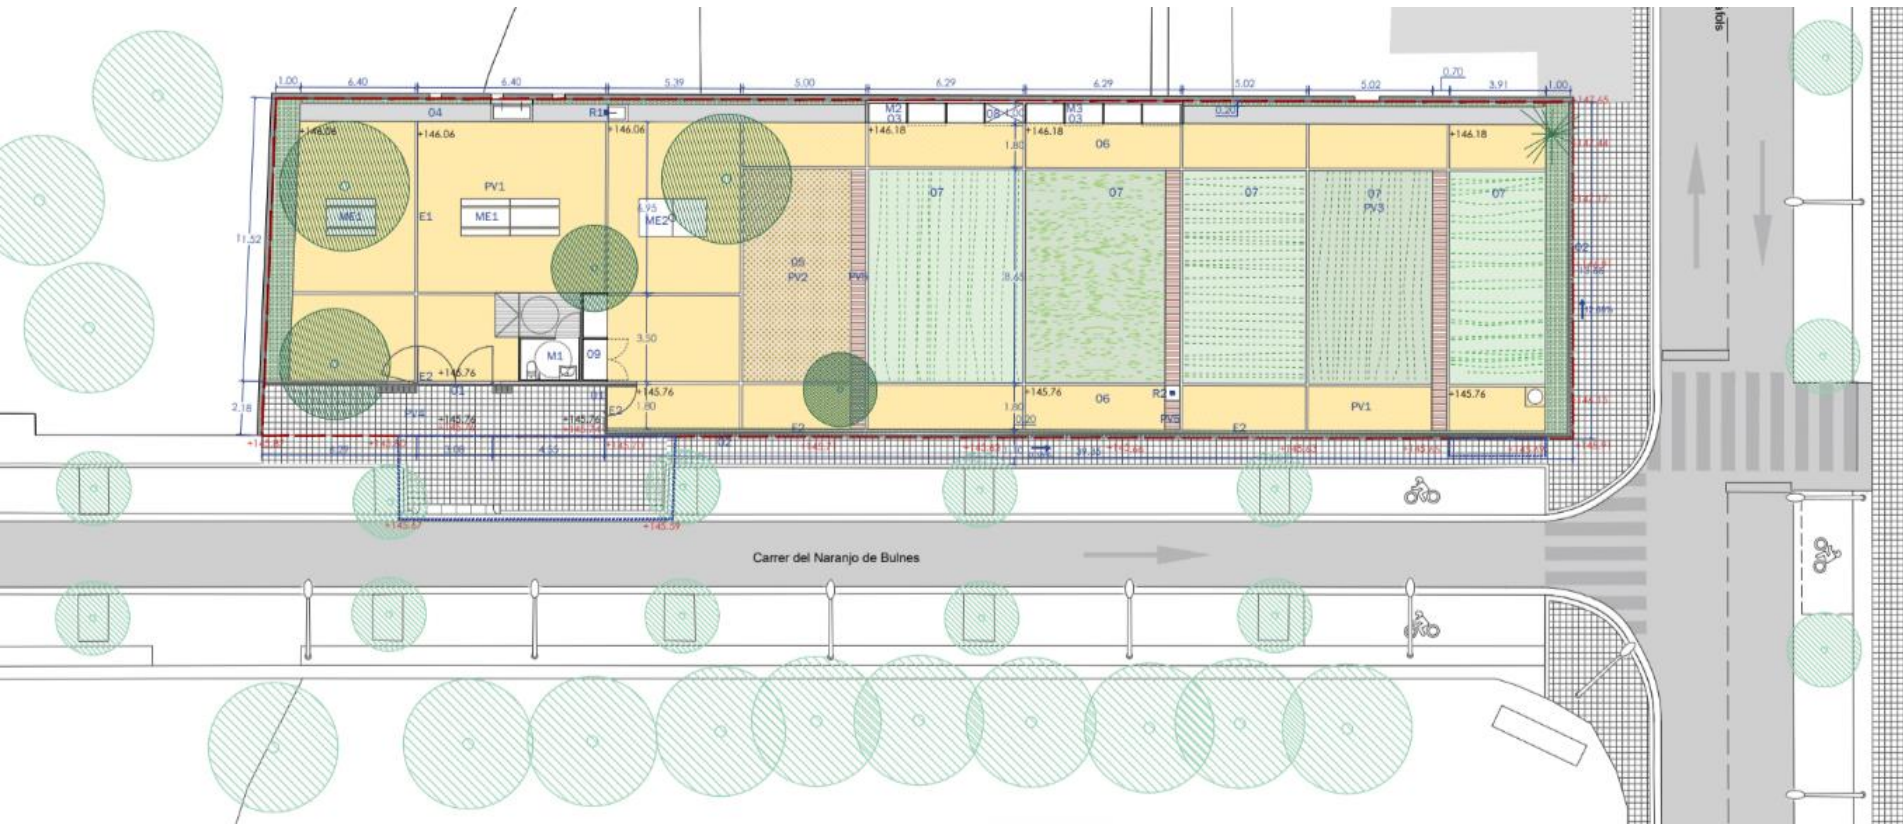



3. Estat dels projectes

Títol	Urbanització carrer Romaninar – Vallvidrera
Import	112.500 €
Previsió execució	2022 – Proposta conveni
Previsió finalització	Resolució jurídica de revisió d'ofici del projecte
Òrgan executor	IMU
Òrgans municipals implicats	Districte
No realitzable	Reunió amb promotors 15 febrer 2022 Aquest projecte no es podrà portar a terme per ser una primera urbanització segons la normativa d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Els diners d'aquest projecte es faran repercutir en altres projectes del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**

