

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**

**DECIDIM.
BARCELONA**





ORDRE DEL DIA


- 1. Benvinguda**
- 2. Estat dels projectes**
- 3. Enquestes de valoració**





1. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI

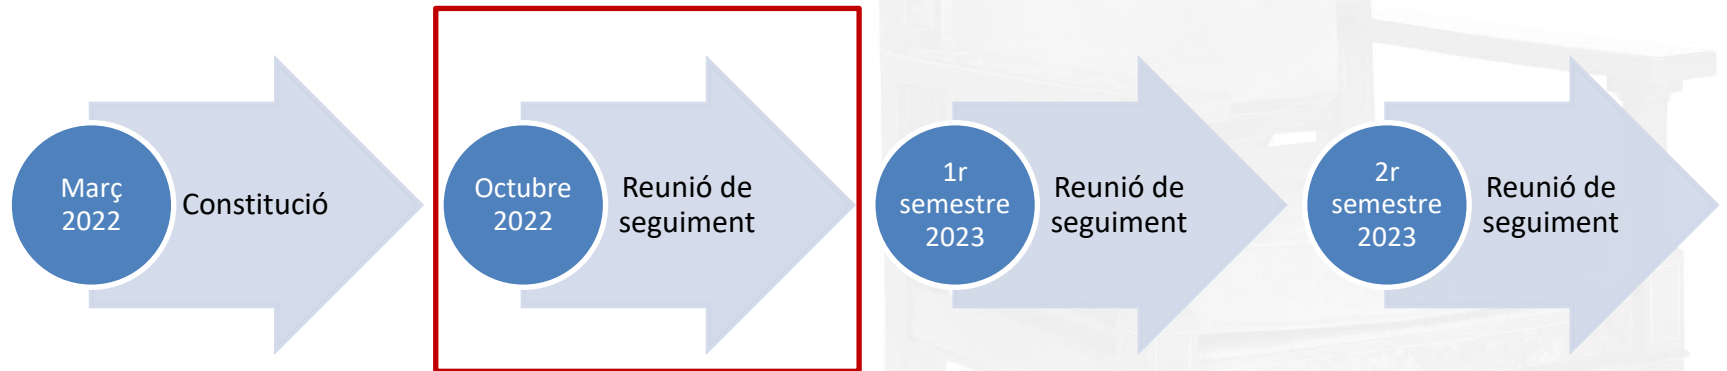



2. Estat dels projectes

Projectes Nou barris	Import del projecte
Reforestem Collserola	50.000 €
Creem un parc inclusiu a Can Dragó	578,000€
Instal·lem bancs adaptats per la gent gran	50.000 €
Obrim un carril bici al Passeig de Fabra i Puig	650.000 €
Fem un parc agrari urbà de Can Valent	700.000 €
Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova	50.000 €
Millorem les voreres de l'Avd Rio de Janeiro (entre Vèlia i ciutat de Mallorca)	270.000 €
Salvem Can Valent	1.175.000 €
Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa nostra en un espai jove	50.000€



2. Estat dels projectes

ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	40 Tramitació administrativa de les obres: 45 Licitació de les obres, 50 adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat



2. Estat dels projectes

Trobada amb els promotors (5%-10%)

Obrim un carril bici a Fabra i Puig (modificació del projecte)

Redacció inicial (10%-20%)

Creem un parc inclusiu a can Dragó

Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa nostra en un espai jove.

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat (20%-30%)

Redacció inicial finalitzada (30%-35%)

Millorem les voreres d'Av Rio de Janeiro

Obrim un carril bici a Fabra i Puig (c/Escòcia)

Fem un Parc agrari de Can Valent

Tramitació administrativa de les obres (35%-50%)

Desenvolupament de les obres (iniciat) (50%-80%)

Desenvolupament de les obres (avançat) (80%-99%)

Salvem Can valent

Finalitzat (100%)

Instal·lem bancs adaptats per a gent gran.

Reforestem Collserola

Obrim aules informàtiques en Trinitat Nova



2. Estat dels projectes


CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES EN EXECUCIÓ

2022



↓
Salvem Can valent

2023



↓
Terrassa de la Cosa Nostra

↓
Millorem les voreres d'Av Rio de Janeiro

2024



↓
Carril bici c/Escòcia

↓
Fem un parc agrari de Can Valent

↓
Creem un parc inclusiu a Can Dragó



2. Estat dels projectes

Títol	Reforestem Collserola
Import	50.000
Previsió execució	2022 – Finalitzada execució
Previsió finalització	2022 finalitzada execució
Òrgan executor	Consorci de Collserola
Estat actual	Actuació finalitzada: Restauració paisatgística del Torrent de Canyelles <ul style="list-style-type: none">- retirada de canya- retirada de deixalles- retirada d'estructures en runa- Revegetació de l'àmbit- arranjamet de la font vella de canyelles- arranjamet de l'antiga mina de Canyelles- arranjamet de camins



2. Estat dels projectes

Títol	Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova
Import	50.000€
Previsió execució	Novembre 2021- març 2022 concreció del llistat de material Març 2022 – setembre2022 execució de la compra
Previsió finalització	Setembre del 2022
Òrgan executor	Districte de Nou Barris
Estat actual	<ul style="list-style-type: none">-S'ha formalitzat el document de cessió amb l'entitat promotora.-S'esta distribuint material a diferents centres per tal de redistribuir les accions.-S'ha creat un grup motor per impulsar el projecte amb entitats , equipaments i serveis, que ja s'ha trobat en unes 5 ocasions-L'establert un acord de col·laboració amb l'institut tecnològic de Barcelona-S'estan realitzant les primeres accions formatives al casal de barri amb voluntariat tal com expressa l'esperit del projecte-El projecte ja forma part del dia a dia del casal de barri



2. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem bancs adaptats per a gent gran
Import	50.000€
Previsió execució	2022 executada
Previsió finalització	2022 finalitzada execució
Òrgan executor	Districte de Nou barris
Estat actual	<p>El projecte inicial demanava el canvi dels bancs de la via Júlia per bancs adaptats.</p> <p>En el moment de l'execució els bancs de la Via Júlia feia poc que s'havien canviat i es va escollir la zona de Can Dragó per fer el canvi.</p> <p>S'han renovat 45 bancs. El model instal·lat ergonòmic.</p>



2. Estat dels projectes

Títol	Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa nostra en un espai jove
Concreció del Projecte	Redacció d'un Pla especial per concedir un increment d'edificabilitat a l'equipament. Es planteja la redacció de l'avant projecte i el planejament derivat.
Import	50.000€
Previsió execució	Arquitectura: Redacció de l'Avantprojecte: octubre 2022 – novembre 2023 Redacció del Projecte Bàsic i Executiu: desembre 2022 – febrer 2023 Tramitació tècnica del Projecte Bàsic i Executiu: març – abril 2023 Aprovació inicial del Projecte Executiu: maig 2023 Planejament: En redacció.
Previsió finalització	Maig 2023*
Òrgan executor	Dte de Nou barris
Estat actual	Pendents de concretar una reunió amb els promotors per informar de l'estat del projecte.



2. Estat dels projectes

Títol	Salvem Can Valent
Concreció del Projecte	Consolidació i sanejament de la masia de Can Valent. Inclou desmuntar coberta i rellotge de sol
Import	1.175.000€
Previsió execució	<i>inici d'obres</i> Abril 2022
Previsió finalització	Desembre 2022
Òrgan executor	Dte de Nou barris i BIMSA
Estat actual	L'obra es troba en avançat estat d'execució. S'han tancat les afectacions arqueològiques a l'execució de l'obra i es continua a bon ritme.



2. Estat dels projectes

Títol	Millorem les voreres de l'Avd Rio de Janeiro (entre Velia i Ciutat de Mallorca)	
Concreció Projecte	Treure els cordons d'aparcament, ampliar la vorera, crear plataformes sobre l'escala actual.	
Import	270.000	
Previsió execució	Contractació del projecte:	Març 2022
	Redacció de l'Avantprojecte:	Abril-Març 2022
	Redacció del Projecte Executiu:	novembre 2022 - gener 2023
	Tramitació tècnica del Projecte Executiu:	febrer – març 2023
	Aprovació inicial del projecte:	abril 2023
	Licitació de les obres:	maig – setembre 2023
Previsió finalització	Execució de les obres:	octubre – desembre 2023
Òrgan executor	BIMSA	
Estat actual	S'han realitzat diferents trobades tècniques amb els promotors per tal de concretar el projecte	



2. Estat dels projectes

Títol	Fem un parc agrari urbà de Can valent
Import	700.000€
Concreció projecte	Avant projecte de la totalitat de l'àmbit + projecte executiu de la part corresponent al 20% de la pastilla. ·Horts urbans, comunitari i parcel·les individuals ·Bosc comestible i hort terapèutic ·Zona àgora ·Esplanada verda per activitats lúdiques
Previsió execució	<i>Contractació del projecte: Març - Abril 2022</i> <i>Redacció de l'Avantprojecte: Maig -Juny 2022</i> <i>Redacció del pla de cales: novembre 2022</i> <i>Execució del Pla de cales: desembre 2022 – gener 2023</i> <i>Redacció del Projecte Executiu: octubre 2022 – gener 2023</i> <i>Tramitació tècnica del Projecte Executiu: febrer – març 2023</i> <i>Aprovació inicial del projecte: abril 2023</i> <i>Licitació de les obres: maig - setembre 2023</i>
Previsió finalització	<i>Execució de les obres: octubre 2023 – març 2024</i>
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	S'han realitzat diferents trobades entre l'equip redactor i els promotors per tal de concretar el projecte.



2. Estat dels projectes

Títol	Creem un parc inclusiu a Can Dragó
Concreció projecte	<p>Millorar l'espai esportiu i lúdic limitat pels carrers AV Meridiana, Av Rio de Janeiro i camp de futbol.</p> <ul style="list-style-type: none">•Estudi de l'entorn•Pista de jocs esportius•Jocs infantils grans•Aparells d'esport per a gent gran•Zona de running amb aparells de calistènia•Adequació de les instal·lacions per a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Import	578.000€
Previsió execució	<p><i>Contractació del Avantprojecte: Març - Abril 2022</i> <i>Redacció de l'Avantprojecte: Abril- Juny 2022</i> <i>Contractació del Projecte Executiu: novembre – desembre 2022</i> <i>Redacció del Projecte Executiu: gener – març 2023</i> <i>Tramitació tècnica del Projecte Executiu: abril – maig 2023</i> <i>Aprovació inicial del projecte: juny 2023</i> <i>Licitació de les obres: juliol – novembre 2023</i></p>
Previsió finalització	Execució de les obres: desembre 2023-maig 2024
Estat actual	<p><i>El projecte preveu la reordenació de tot l'àmbit. Està definit en fases i, segons parlat amb promotors, ara s'estan licitant els executius de les fases corresponents a pressupostos participatius i a feines necessàries per a poder-los executar.</i></p>



2. Estat dels projectes

Títol	Obrim un carril bici al carrer Fabra i Puig
Concreció projecte	Creació d'un carril bici unidireccional entre (Avd Meridiana i pl Virrei Amat) pels carrer Fabra i Puig i un altre c/Escòcia. Modificació: Es crearà un carril bici al carrer Escòcia. I es farà un estudi de la zona de Fabra I Puig per valora la viabilitat.
Import	650.000€
Previsió execució	ESCÒCIA: Inici de redacció del Projecte Executiu: Novembre 2022 Entrega de la maqueta del Projecte Executiu: Febrer 2023 Aprovació inicial del projecte: Maig 2023 Execució de les obres: Octubre 2023 – Gener 2024 FABRA i PUIG: Segons parlat amb els promotors de l'actuació, s'està contractant l'estudi de mobilitat del carrer i els seus entorns que ha de permetre la definició de l'actuació a realitzar.
Previsió finalització	
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	Pendent de tancar la modificació. Possibilitat d'ampliar l'estudi de viabilitat de carrils bici a altres espais del Districte.



3. Enquestes de valoració

Valorar la última fase en la que s'han realitzat les tasques d'execució del teu projecte.

El període d'execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme

EXECUTAT COMPLETAMENT

NO EXECUTAT COMPLETAMENT

L'EXECUTIU APROVAT

OBRA EXECUTADA

Per accedir al qüestionari selecciona aquest enllaç:

<https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577>

La durada aproximada de resposta és d'uns 10 minuts. En molt poc temps ens pots ajudar a millorar la participació a Barcelona. El registre de les teves respostes no recollirà cap dada personal.

Gràcies per la vostra participació
