

Comissió de seguiment de Pressupostos participatius 2020-2023

Districte de Sant Andreu

**DECIDIM.
BARCELONA**






1. Estat dels projectes - Octubre 2022

Obres finalitzades	
<ul style="list-style-type: none">Fem un pati més inclusiu a l'Escola El SagrerRenovem el paviment del passeig de Fabra i PuigReformem la seu de l'entitat T'acompanyem	100%
Obres iniciades	
<ul style="list-style-type: none">-	50-95%
Obres licitades	
<ul style="list-style-type: none">Renovem la vorera del CAP Sant AndreuPacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull	35-50%
Redacció projecte final	
<ul style="list-style-type: none">Millorem el parc de la PegasoConstruïm el primer parc inclusiu als Jardins de MassanaInstal·lem aplic. subtitulació simultània 16 equipaments	30-35%
Participació - Redacció inicial avantprojecte	
<ul style="list-style-type: none">Pacifiquem una zona del casc antic de St Andreu Palomar	0-30%

PERCENTATGE D'EXECUCIÓ



2. Calendari de previsió finalització dels projectes

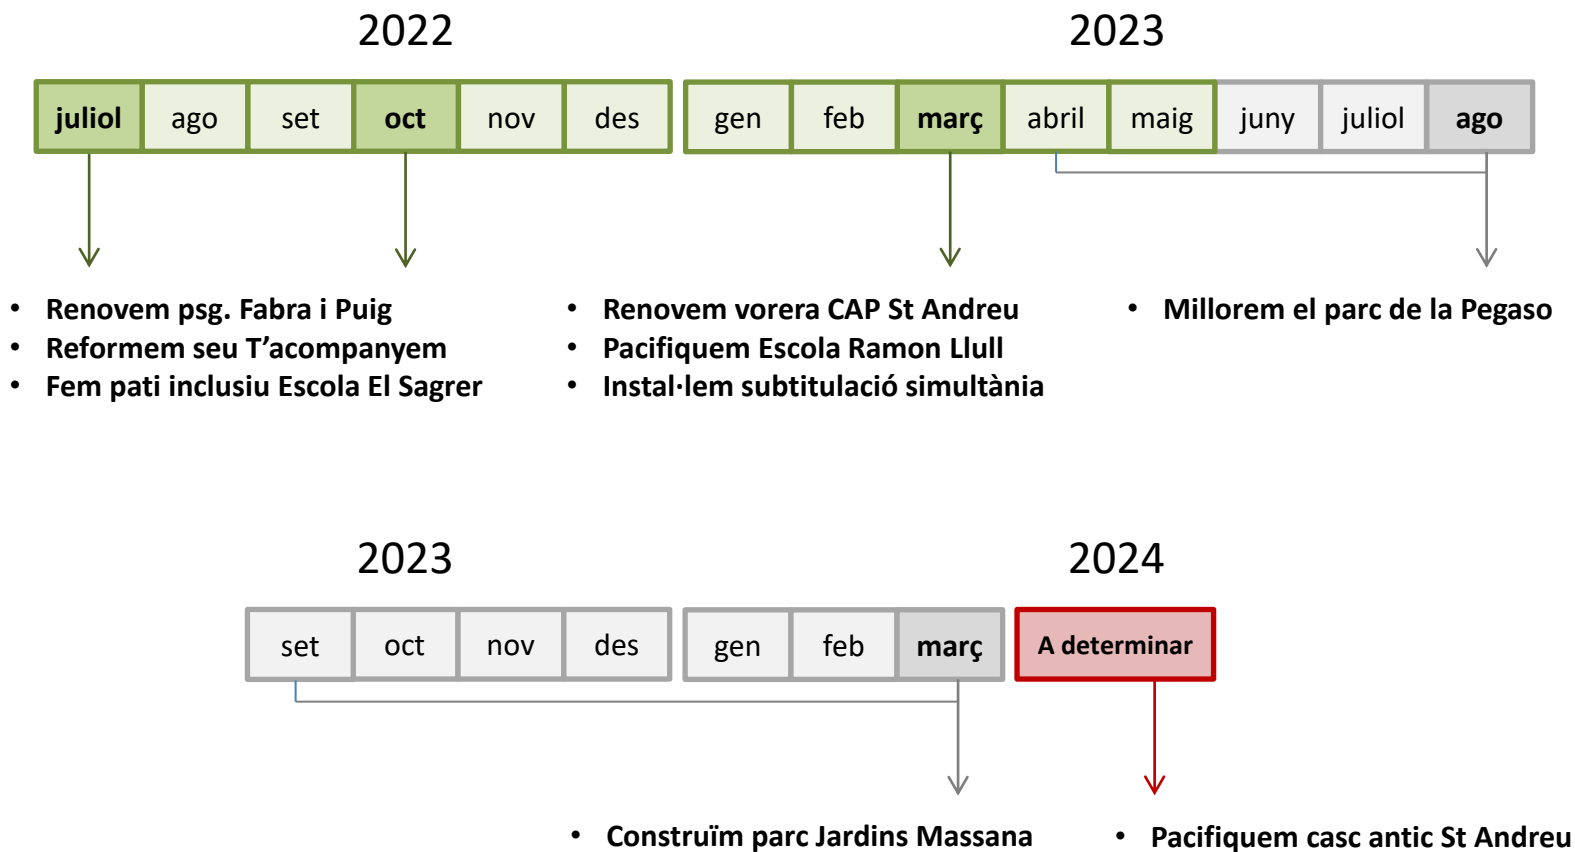



Projecte 1: “Millorem el parc de la Pegaso”



Import	585.000 €
Licitació d'obres	Novembre 2022 – març 2023
Previsió inici d'obres	Abril 2023 (durada 5 mesos)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins.
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	<ul style="list-style-type: none">- Millores accessibilitat al parc- Muntanyeta- Pradera: usos lúdics compartits i joc infantil (taules, tirolina accessible, cautxú)- Ampliació espai gossos (a l'altra zona del parc).



Projecte 2: “Construïm el primer parc inclusiu de Barcelona als Jardins de Massana”



Import	*985.000 €
Licitació d'obres	Març – juliol 2023
Previsió inici d'obres	Setembre 2023 (durada 8 mesos)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins, Institut Infància, IMPD.
Participació	Validació projecte amb promotores.
Inclou	- Distribució d'usos, tipologia d'elements de joc, i concrecions finals.

**Augment de l'import a conseqüència de l'augment del preu dels materials i de les certificacions dels elements de joc a instal·lar.*



Projecte 3: “Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu”



Import	175.000 €
Licitació d'obres	Setembre 2022 – gener 2023
Previsió inici d'obres	Febrer 2023 (durada 1-2 mesos)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Mobilitat
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	<ul style="list-style-type: none">- Ampliació de la vorera.- Condicionaments de l'estacionament PMR, terrassa en calçada del bar, marquesina parada de l'autobús i desnivell vorera i entrada secundària CAP.



Projecte 4: “Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar”



Import	400.000 €
Previsió redacció executiu	Per concretar (2022-2023)
Previsió inici d'obres	Per concretar (2023-2024)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Mobilitat
Participació	Sessions obertes de participació ciutadana. Reunions amb AVVs, comunitats de veïnes. Pendent validació amb promotores.
Estat actual	<ul style="list-style-type: none">- Redacció Estudi de diagnosi (juny 2021)- Redacció Prop. estratègica v.1 (des. 2021)- Redacció Prop. estratègica v.2 (oct. 2022)- Primeres accions necessàries a executar: <i>obertura i pavimentació c/ Sant Adrià.</i>



Projecte 5: “Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer”



Import	193.000 €
Finalització d'obres	Agost 2022 – Octubre 2022
Òrgan executor	CEM
Òrgans municipals implicats	CEM, Districte
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	<ul style="list-style-type: none">- Pista central i descans- Pati P3, pati P4-P5, caseta i hort



Projecte 6: “Renovem el paviment del psg de Fabra i Puig”



Import	910.000 €
Finalització d'obres	Juliol 2022
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Participació	Validat projecte amb promotores
Inclou	Continuïtat amb 1r tram. Incidències: Revisió material pavimentació.



Projecte 7: “Pacifiquem l’entorn de l’Escola Ramon Llull”



Import	85.000 €
Previsió inici obres	Novembre - desembre 2022 (4 mesos)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Ecologia Urbana, Mobilitat
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	<ul style="list-style-type: none">- Incorpora trasllat contenidors i trànsit rodat.- Per concretar ubicació terrasses restauració.



Projecte 8: “Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem”



Import	50.000 €
Finalització d'obres	Juliol 2022
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Districte
Participació	Validació amb promotores
Inclou	<ul style="list-style-type: none">- Sistema elèctric i clima.- Manteniment i millora infraestructures.



Projecte 9: “Instal·lem aplicacions de subtitulació simultània d’esdeveniments en 16 equipaments districte”



Import	50.000 €
Licitació contractació	Desembre 2022 – febrer 2023
Previsió inici d’instal·lació	Febrer – març 2023
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Districte, IMPD, IMI
Participació	Validació amb promotores
Inclou	<ul style="list-style-type: none">- Prèvia: Equipar streaming a 10 equipaments- Complementar equip a 10 equipaments- Equipar completament 6 equipaments



3. Enquestes de valoració

Valorar la fase d'execució del vostre projecte. El període d'execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme.

Enllaç: <https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577>

OPCIÓ A: EXECUTAT COMPLETAMENT

- Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer
- Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig
- Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem

OPCIÓ B: NO EXECUTAT COMPLETAMENT (PROJECTE APROVAT/LICITAT)

- Millorem el parc de la Pegaso
- Construïm el primer parc inclusiu als Jardins de Massana
- Renovem la vorera del CAP Sant Andreu
- Pacifiquem una zona del casc antic de St Andreu de Palomar
- Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull
- Instal·lem aplic. subtitulació simultània 16 equipaments

*La durada aproximada de resposta és d'uns **10 minuts**. El registre de les teves respostes no recollirà cap dada personal.*



4. Recull d'aportacions i compromisos

Millorem el parc de la Pegaso

- Pendent sol·licitar projecte definitiu a BIMSA.

Construïm parc Jardins Massana

- Sol·licita que s'inclogui el nom complet del Projecte "...a Barcelona"
- Pendent de validar projecte definitiu treballat per BIMSA.

Pacifiquem casc antic St Andreu

- Mostra la preocupació de que el projecte no acabi realitzant-se.
- Pendent establir calendari de retorn al manifest i de la proposta estratègica de Barcelona Regional.

Pacifiquem Escola Ramon Llull

- Mostra la preocupació per com anirà l'obra.
- Pendent sol·licitar projecte definitiu a Ecologia Urbana/BIMSA i traslladar preocupació.

Instal·lem subtitulació simultània

- Sol·licita que s'iniciï la instal·lació per la Biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra
- S'ofereixen per fer les proves necessàries.
- Pendent fer seguiment de la licitació i trasllat de les demandes.



**Ajuntament
de Barcelona**

